COVÉA · DSIN · PROJET PRJ0400867

Espace documentaire GMF Feuille de route de réalisation

Étude composant par composant de ce qui se réalise en SharePoint standard, en configuration, en Power Automate ou en développement, et plan de travail pour démarrer.

Source : Spécification fonctionnelle générale v1.0 (21/04/2026)
Solution retenue : pages SharePoint natives + PnP Modern Search
Version de travail · 5 novembre 2026

Standard | Configuration | Power Automate | Développement | Script

SOMMAIRE

Contenu du document

1. Synthèse 3
2. Le projet en bref 4
3. Méthode et prérequis techniques 5
4. Étude écran par écran 6
5. Fonctions transverses 15
6. Recommandations d'architecture 18
7. Charge de réalisation 19
8. Feuille de route 20
9. Première semaine 21
10. Arbitrages à obtenir 22
Annexe · Propriétés gérées de recherche 23

SYNTHÈSE

1. Synthèse


L'étude couvre **61 composants et fonctions** : 34 éléments visibles sur les 7 écrans maquettés, et 27 fonctions transverses (données, droits, publication, recherche, pilotage, éditique, migration). Un composant peut relever de deux catégories.

20
en SharePoint standard, sans code

14
en configuration (PnP Modern Search, schéma de recherche)

8
en flux Power Automate

18
en développement SPFx



Ce qu'il faut retenir

- **Les pages d'accueil se font en standard.** En-tête, hub, tuiles, liens transverses et accès profilés reposent sur la navigation native et les Liens rapides avec ciblage d'audience.
- **La recherche se fait en configuration.** Toute la page de résultats et la home page recherche relèvent de PnP Modern Search, à condition de mapper les propriétés gérées en premier.
- **Le développement se concentre sur la navigation par arborescence.** Menu latéral, sous-menu, menu de niveau 7 et fil d'ariane forment un seul package SPFx. Les favoris en forment un second. Les autres développements sont petits ou candidats au lot 2.
- **Le workflow s'appuie sur le natif.** L'approbation et la planification de pages existent ; Power Automate complète pour les statuts, les contrôles et les notifications Teams.

Points de vigilance

- **Calendrier :** la MEP prévisionnelle (§5) est novembre 2026, c'est-à-dire maintenant. Le planning ci-après est relatif (S1, S2…) et doit être recalé sur le jalon réel.
- **Chemin critique :** tout package SPFx, y compris PnP Modern Search, doit être déployé dans le catalogue d'applications du tenant. La validation sécurité Covéa peut prendre plusieurs semaines : à lancer dès la semaine 1.
- **Données d'abord :** sans colonnes, liste Arborescence et propriétés gérées, ni la recherche ni la navigation ne peuvent être testées.

CONTEXTE

2. Le projet en bref

Migrer la documentation métier GMF, aujourd'hui sur Lotus Notes (Odyssée, Esdi@) et d'autres socles, vers un espace documentaire unique dans SharePoint Online.

Objectifs (§1.3)

- Centraliser le patrimoine documentaire GMF
- Garantir l'unicité et la traçabilité des contenus
- Donner un accès sécurisé selon les profils
- Améliorer navigation et recherche
- Remplacer Lotus Notes
- Structurer le cycle de vie : création, validation, publication, dépublication
- Outiller le pilotage par des statistiques

Périmètre applicatif (§2.2)

Odyssée, Esdi@, M@doc Auto / IRD, référentiel risques spécifiques, Doc DMCP, référentiel Entreprise et Téléassurances, éditique (imprimés contractuels).

Décisions structurantes

Solution	Pages SharePoint natives. Power Apps écarté (annexe 18.2).
Navigation	Une liste « Arborescence » (Id, IdParent, Niveau, Ordre, chemins, Statut, Habilitation) pilote menus et fil d'ariane (§9.2).
Stockage	Un répertoire par propriétaire, pour poser les droits au niveau dossier (§9.1).
Arborescence	Gérée par la DSIN uniquement, au moins en lot 1 (§11).
Workflow	Brouillon → En attente de validation → En attente de publication → Publié, notifications Teams (§7.1.4).
Migration	HTML exporté par CooperTeam, nettoyé et importé par PowerShell, métadonnées depuis Excel (§8.2).
Jalons	CESI initial 6 mai 2026, final juillet 2026, MEP novembre 2026 (§5).

Interlocuteurs (§3.2.1)

Pilote SI	Eric Saverot, DSIN
Pilote entreprise	Natacha Courroux, DTP
Pilotes DIARD	A.-S. Tricoire (produit), H. Bertille (sinistre)
Pilote de MAD	David Kern

MÉTHODE

3. Méthode et prérequis techniques

Chaque élément des maquettes et chaque exigence fonctionnelle est classé selon le moyen le plus simple de le réaliser.

CATÉGORIE	SIGNIFICATION	QUI / QUEL OUTIL
Standard	Fonction native de SharePoint Online, réglée par l'interface. Aucun code, aucun déploiement.	Administrateur du site
Configuration	Paramétrage avancé sans code compilé : composants PnP Modern Search, modèles Handlebars et CSS des modèles, schéma de recherche, mise en forme JSON.	Intégrateur SharePoint
Power Automate	Flux low-code déclenché par un événement ou une planification.	Power Automate
Développement	Composant SPFx (TypeScript / React) empaqueté et déployé dans le catalogue d'applications.	Développeur SPFx
Script	Script exécuté par la DSIN : provisioning, migration, contrôles planifiés.	PnP.PowerShell

> **Règle à garder en tête**
>
> Une page SharePoint moderne n'accepte ni CSS ni JavaScript personnalisés. Dès qu'un rendu dépasse les options des composants natifs, il faut passer par les modèles PnP (pour ce qui s'affiche à partir de la recherche) ou par un composant SPFx.

Prérequis à vérifier avant de développer

#	PRÉREQUIS	POURQUOI	AUPRÈS DE
1	**PnP Modern Search v4 déployé dans le catalogue d'applications**	Toute la recherche (§10.2.5) en dépend. Noter la version : elle conditionne le passage des filtres dans l'URL.	**Admin tenant**
2	**Processus de validation des packages SPFx Covéa**	Délai souvent long ; conditionne les 4 packages du plan.	**Sécurité, DSIN**
3	**Droits d'administration de la collection de sites**	Nécessaires pour mapper les propriétés gérées et relancer l'indexation.	**Équipe SharePoint**
4	**Thème d'organisation aux couleurs GMF**	Déclaré au niveau tenant (Add-SPOTheme).	**Admin tenant**
5	**Ciblage d'audience et approbation de pages activables**	Accès profilés (C5) et workflow (T10).	**Admin du site**
6	**Groupes EntraID de test (préfixe GAZH)**	Tester les droits sans toucher la production (§18.1.1).	**Habilitations**
7	**Licences et connecteurs Power Automate (Teams, SharePoint)**	Flux de workflow et d'éditique.	**DSIN**


ÉTUDE DÉTAILLÉE

4. Étude écran par écran

Les 7 écrans de la spécification (34 éléments) : 10 en standard, 12 en configuration et 12 en développement.

A En-tête commun à toutes les pages

§10.1.2.1 · p. 41




Maquette extraite de la spécification fonctionnelle générale, §10.1.2.1 · p. 41.

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
A1	**Menu du hub : Odyssée, Doc DMCP, Imprimés GMF**	Standard	Navigation de site hub : associer les sites au hub et saisir les liens dans la barre du hub. > Liens « en dur », conforme à la spécification. M@doc Auto et IRD s'ajoutent plus tard sans développement.
A2	**Bandeau logo + « Espace Documentation GMF »**	Standard	En-tête du site (Modifier l'apparence › En-tête, disposition Étendue) et logo. > La couleur pétrole demande un thème d'organisation déclaré par un administrateur du tenant (Add-SPOTheme). À demander tôt.
A3	**Menu du site : Accueil, Famille de produit ▾, Transverse ▾, Recherche**	Standard	Navigation du site en cascade ou méga-menu, sous-liens saisis à la main. > Si les familles doivent être lues dans la liste Arborescence (TODO §10.1.2.1), il faut un Application Customizer SPFx. Recommandation : rester statique.

B Pré-homepage / Homepage du hub

§10.2.1 · p. 43

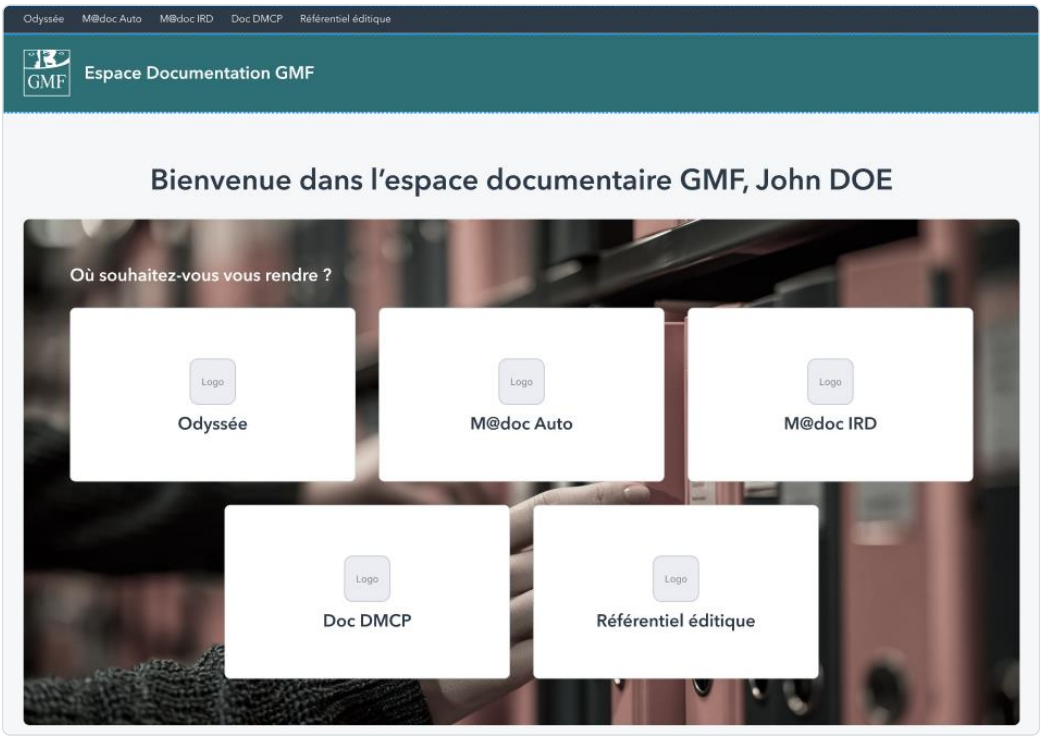


Maquette extraite de la spécification fonctionnelle générale, §10.2.1 · p. 43.

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
B1	**Fond photo + 5 tuiles (Odyssée, M@doc Auto, M@doc IRD, Doc DMCP, Référentiel éditique)**	Standard	Section avec image d'arrière-plan + composant Liens rapides (disposition Vignettes) ou Hero. > Conforme à la spécification : « codée en dur par composants standard ».
B2	**« Bienvenue ..., John DOE » (prénom de l'utilisateur)**	Configuration	Pas de texte personnalisé en natif. Soit un titre fixe (standard), soit PnP Search Results avec le jeton {User.DisplayName}. > Écart purement cosmétique : à faire valider sans prénom.

C Homepage documentation GMF

§10.2.2 · p. 44

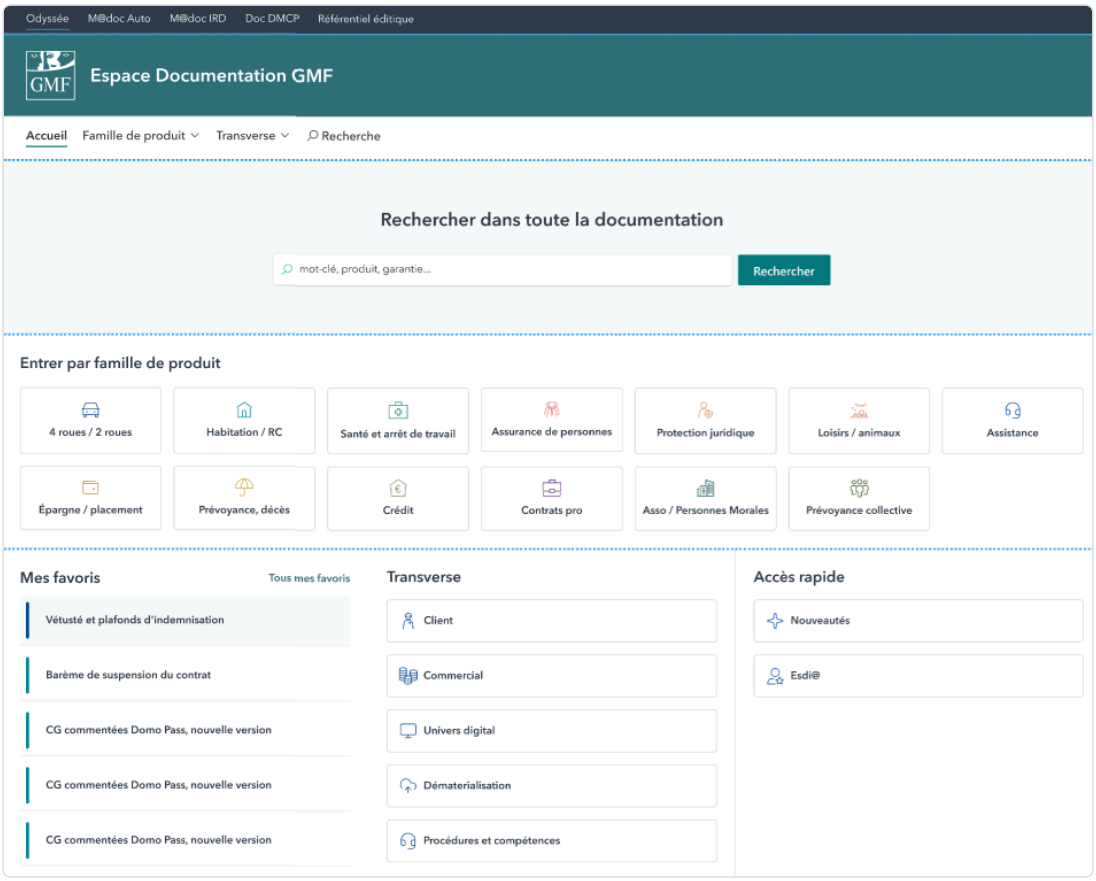


Maquette extraite de la spécification fonctionnelle générale, §10.2.2 · p. 44.

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
C1	**Zone « Rechercher dans toute la documentation »**	Configuration	PnP Search Box qui redirige vers la page de résultats avec le mot-clé dans l'URL. > Rediriger aussi la recherche native de l'en-tête vers cette page (Set-PnPSearchSettings -SearchPageUrl), sinon deux expériences coexistent.
C2	**Tuiles « Entrer par famille de produit » (13 familles)**	Standard	Liens rapides, disposition Boutons, icônes Fluent intégrées. > Spécification contradictoire : « en dur » et « tous les nœuds de niveau 2 ». Le statique est recommandé : les familles changent rarement.
C3	**Mes favoris (5 derniers + « Tous mes favoris »)**	Développement	Liste « Favoris » (utilisateur, page, localisation) + composant SPFx d'affichage. > Aucun favori de page natif filtrable : « Enregistrer pour plus tard » ne concerne que les actualités. Mutualisé avec E4, D6 et G5.
C4	**Transverse : Client, Commercial, Univers digital…**	Standard	Liens rapides, disposition Liste ou Boutons.
C5	**Accès rapide profilé : Esdi@, Risques spécifiques, Nouveautés**	Standard	Liens rapides avec ciblage d'audience sur des groupes EntraID. > Activer le ciblage d'audience sur la bibliothèque Pages. Il masque l'affichage mais ne protège rien : les droits restent posés sur les contenus.

D Homepage d'une famille de produits

§10.2.3 · p. 45-46

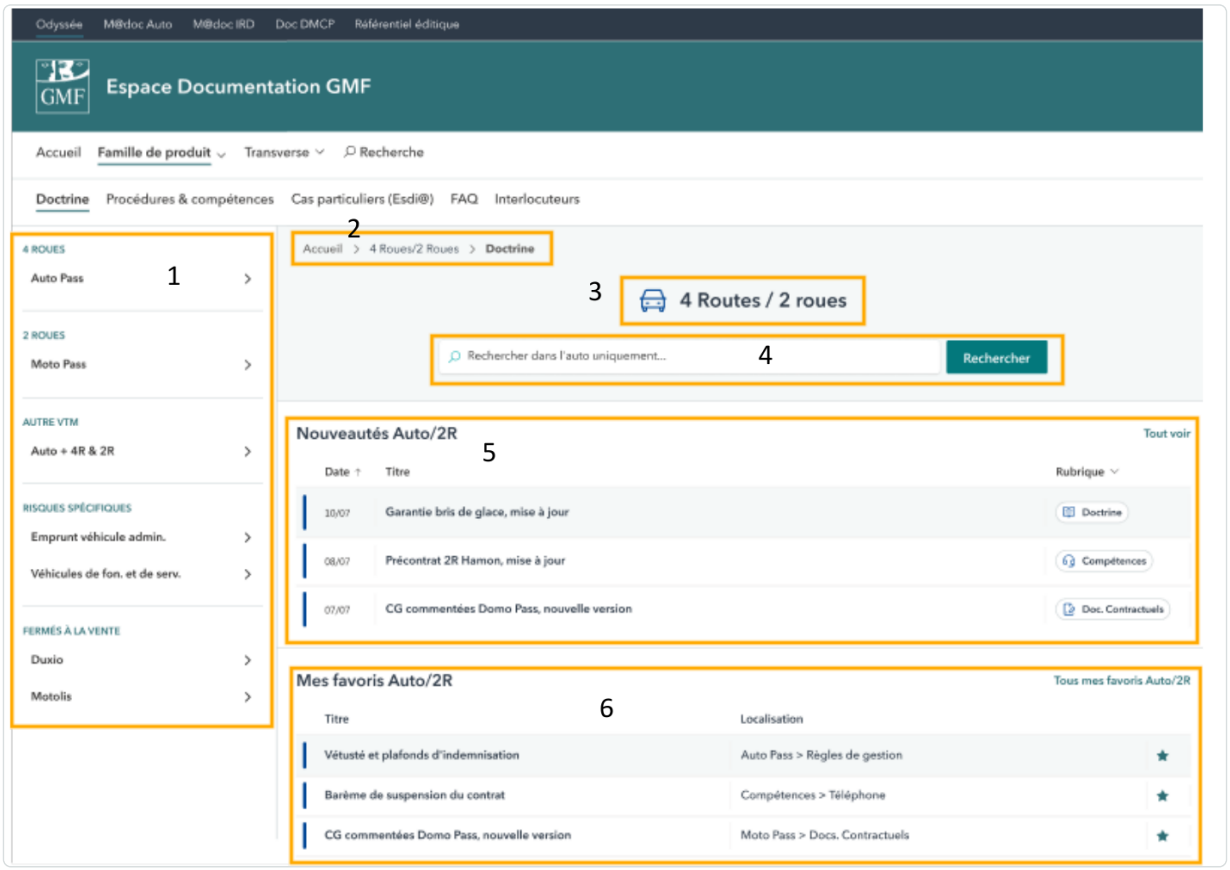




Maquette extraite de la spécification fonctionnelle générale, §10.2.3 · p. 45-46.

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
D0	**Sous-menu du site : niveau 3 (Doctrine, FAQ, Interlocuteurs…) + liens fixes**	Développement	Composant SPFx lisant les enfants du nœud famille dans la liste Arborescence, complétés par « Procédures et compétences » et « Cas particuliers ». > Alternative standard : Liens rapides horizontaux saisis par famille (13 pages à maintenir à la main).
D1	**① Menu arborescent latéral, niveaux 4 à 6, dépliable**	Développement	Composant SPFx « arbre » lisant la liste Arborescence, filtré sur Active et Statut. L'API respecte les droits posés sur les nœuds. > Cœur du développement : aucun équivalent natif en page moderne.
D2	**② Fil d'ariane**	Développement	Lecture de l'Id de nœud de la page, puis des libellés et liens des ancêtres. > Pas de fil d'ariane sur les pages modernes. Faisable en configuration PnP (découpage d'ArborescenceLibellé) mais sans liens fiables : à intégrer au même package.

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
D3	③ **Titre de la famille + pictogramme**	Standard	Composant Texte si une page par famille. > Devient du développement si l'on garde une page dynamique unique (voir recommandation R2).
D4	④ **Recherche préfiltrée sur la famille**	Configuration	PnP Search Box vers la page de résultats, filtre famille passé dans l'URL ou modèle de requête avec {QueryString.famille}.
D5	⑤ **Nouveautés de la famille (date, titre, rubrique, « Tout voir »)**	Configuration	PnP Search Results : famille + date de nouveauté ≥ {Today-N}, tri par date, modèle tableau avec badges. > « Contenu mis en évidence » (standard) est possible, mais son rendu et ses filtres sont trop limités.
D6	⑥ **Mes favoris filtrés sur la famille**	Développement	Même composant que C3, avec la famille en paramètre.

E Page « produit »

§10.2.4 · p. 48

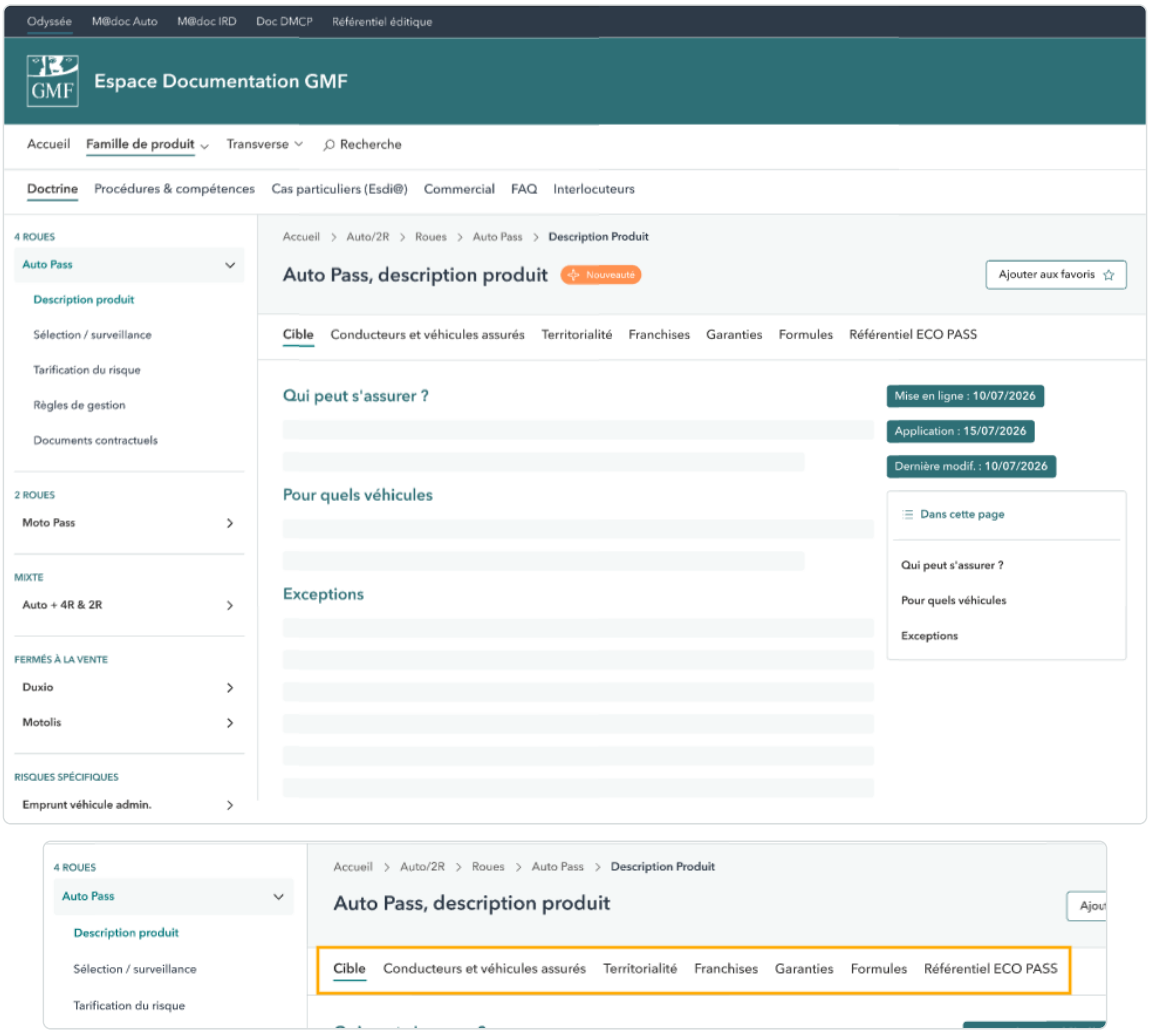


Maquette extraite de la spécification fonctionnelle générale, §10.2.4 · p. 48.

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
E1	**Menu latéral avec niveaux 5 et 6 dépliés**	Développement	Même composant que D1, nœud courant ouvert et mis en évidence.
E2	**Fil d'ariane**	Développement	Même composant que D2.
E3	**Titre + badge « Nouveauté »**	Configuration	Titre de page natif ; badge par PnP Search Results ciblé sur la page courante ou intégré au package SPFx.
E4	**Bouton « Ajouter aux favoris »**	Développement	Écriture dans la liste Favoris depuis un composant SPFx. > Mutualisé avec C3.
E5	**Menu horizontal de niveau 7 (Cible, Conducteurs, Franchises…)**	Développement	Mode horizontal du composant arborescence. > Alternative : le script de migration génère des Liens rapides par page. Rapide, mais ils se périment à chaque évolution de l'arborescence.
E6	**Contenu en rubriques (« Qui peut s'assurer ? »…)**	Standard	Composant Texte + sections réductibles natives. > Les titres H2/H3 ont des ancres natives : à confronter au §8.2.2, qui déclare les ancres non fonctionnelles.

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
E7	**Bloc dates : mise en ligne, application, dernière modification**	Standard	Composant « Propriétés de la page » sur les colonnes de dates. > Rendu natif sobre ; le style en pastilles de la maquette demande de la configuration ou du code.
E8	**Encart « Dans cette page » (sommaire)**	Développement	Petit composant SPFx listant les titres de la page. > Ou sommaire manuel en liens d'ancre, saisi par le contributeur (standard).
E9	**Bloc d'infos toujours visible au défilement**	Développement	Section verticale native (standard) mais non collante ; l'effet collant demande du CSS impossible en page native. > Recommandation : accepter le bloc non collant.

F Home page recherche

§10.2.5.1 · p. 49

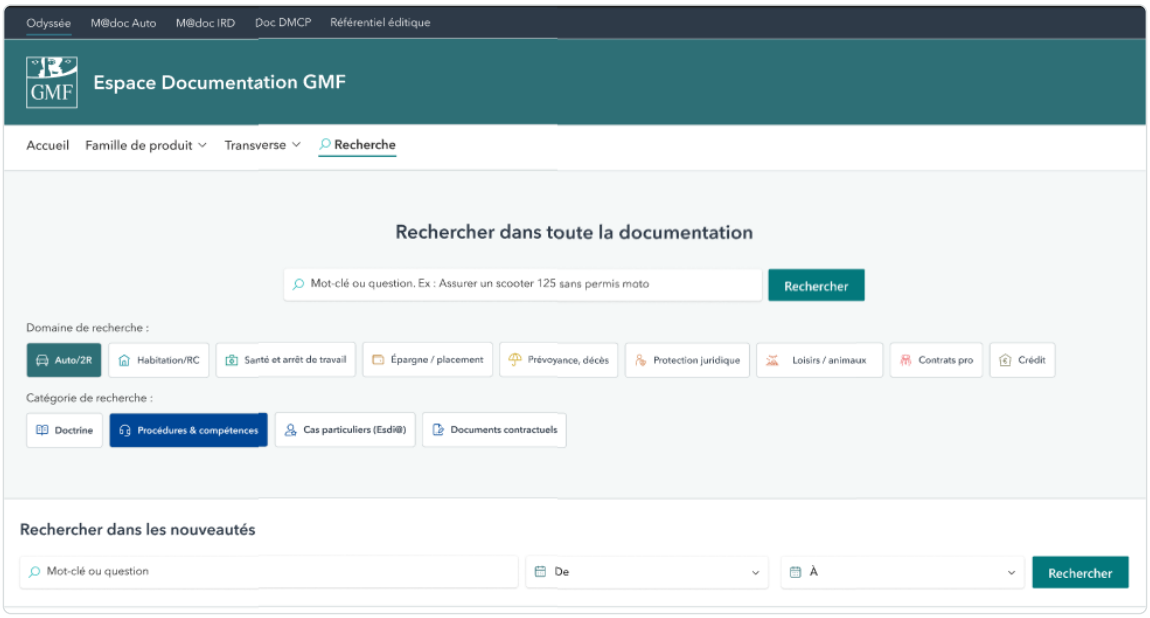


Maquette extraite de la spécification fonctionnelle générale, §10.2.5.1 · p. 49.

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
F1	**Recherche globale**	Configuration	PnP Search Box.
F2	**Tuiles « Domaine de recherche » et « Catégorie de recherche »**	Configuration	PnP Search Filters avec le modèle Handlebars en tuiles (déjà réalisé). > À valider : transmission des filtres vers la page de résultats (page unique dont les résultats s'affichent après la requête, ou filtres passés dans l'URL selon la version PnP déployée). Icône propre à chaque valeur : CSS par position, avec un tri fixe.
F3	**Rechercher dans les nouveautés (mot-clé + De / À)**	Configuration	Search Box + filtre plage de dates sur une propriété RefinableDate.

G Page de résultats

§10.2.5.2 · p. 50

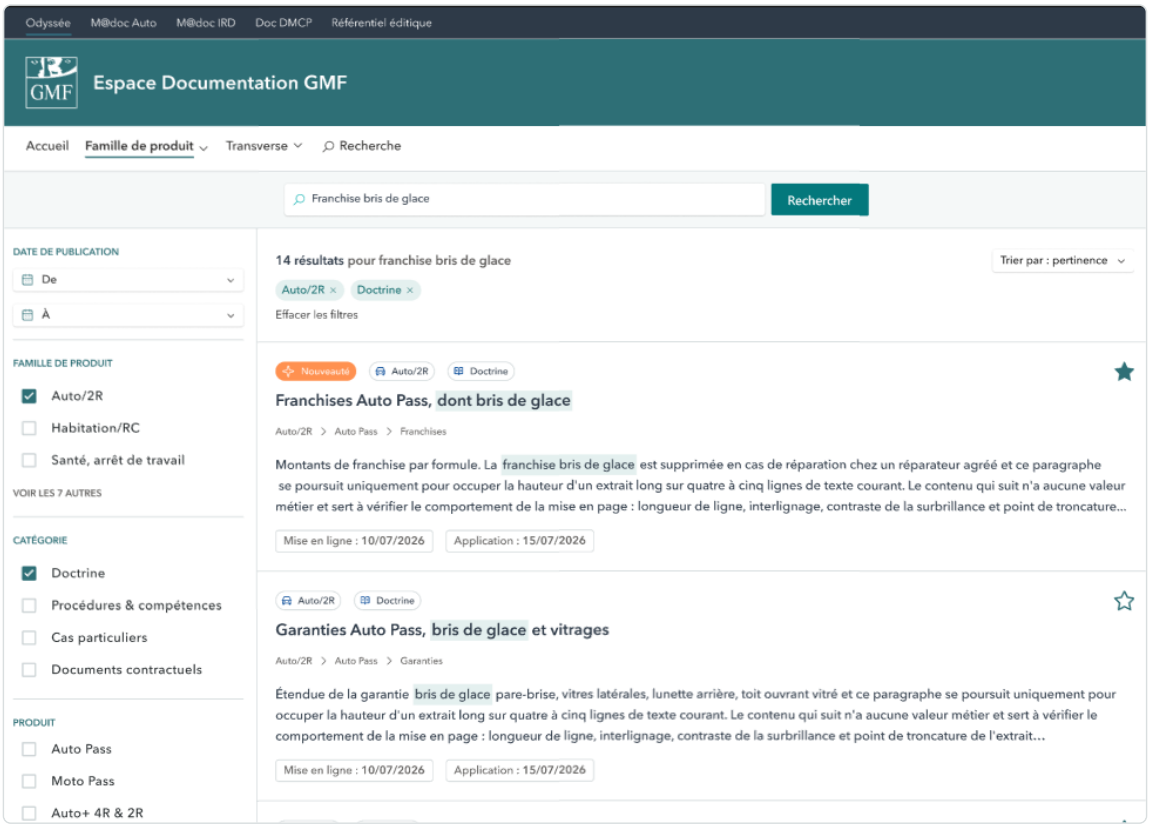

Maquette extraite de la spécification fonctionnelle générale, §10.2.5.2 · p. 50.

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
G1	**Champ, compteur « 14 résultats pour... », tri**	Configuration	PnP Search Box + Search Results (tri pertinence ou date).
G2	**Filtres actifs en pastilles + « Effacer les filtres »**	Configuration	Affichage natif des sélections de PnP Search Filters.
G3	**Filtres latéraux Date, Famille, Catégorie, Produit + « Voir les 7 autres »**	Configuration	PnP Search Filters : plage de dates, cases à cocher, nombre de valeurs affichées.
G4	**Carte de résultat : badges, chemin, extrait surligné, dates**	Configuration	Modèle Handlebars : HitHighlightedSummary, ArborescenceLibellé, propriétés RefinableDate. > Les nouvelles pages apparaissent après indexation (jusqu'à 1 h, §10.2.5.2).
G5	**Étoile favori sur chaque résultat**	Développement	Affichage possible en configuration ; l'ajout ou le retrait écrit dans la liste Favoris, donc SPFx. > Mutualisé avec C3.

ÉTUDE DÉTAILLÉE

5. Fonctions transverses

Exigences des §7, 9, 11 et 12 qui ne se voient pas sur les maquettes mais conditionnent le fonctionnement.

Données et structure

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
T1	**Colonnes de site + type de contenu « Page documentation » (§7.1.2.3)**	Standard Script	Natif ; à provisionner par script PnP pour rejouer à l'identique en recette puis en production.
T2	**Liste Arborescence (§9.2)**	Standard	Liste native avec les colonnes de la spécification.
T3	**Calcul automatique d'ArborescenceId, ArborescenceLibellé et Niveau**	Power Automate	Flux à la création ou modification d'un nœud, qui remonte les parents. > Ou calcul par le script DSIN, puisque la DSIN gère seule l'arborescence (§11).
T4	**Rattachement d'une page à un nœud par listes en cascade (§11)**	Développement	Composant SPFx réservé aux contributeurs, qui écrit l'Id et le chemin dans les colonnes de la page. > Alternative standard : colonne Recherche (lookup) vers la liste Arborescence. Pas de cascade, mais aucun code.
T5	**Multi-rattachement d'un même contenu (§7.1.2.1)**	Développement	Lookup multi-valeurs, pris en compte par le menu et le fil d'ariane. > Question à trancher : quel chemin affiche le fil d'ariane ?
T6	**Propriétés gérées de recherche**	Configuration	Mapper les propriétés analysées vers RefinableString / RefinableDate (schéma de la collection de sites), puis réindexer. > Prérequis bloquant de toute la recherche (voir annexe).

Habilitations

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
T7	**Droits par bibliothèque ou dossier propriétaire + groupes EntraID (§9.1)**	Standard	Permissions natives et héritage.
T8	**Report automatique des droits du parent sur un nouveau nœud (TODO §7.1.3)**	Power Automate	Flux qui copie les groupes du nœud parent sur l'élément créé. > Microsoft recommande de rester sous 5 000 éléments à permissions uniques par liste : privilégier les droits au niveau dossier.
T9	**Nœuds en brouillon visibles des seuls contributeurs (§9.2)**	Développement	Logique du composant menu : Statut + appartenance au groupe contributeur.

Publication

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
T10	**Workflow brouillon → validation → publication (§7.1.4)**	Standard Power Automate	Approbation de pages native (flux Power Automate standard), étendue pour poser le statut et notifier Teams.

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
T11	**Publication programmée à une date**	Standard	Planification de pages native de la bibliothèque Pages.
T12	**Dépublication automatique à date**	Power Automate	Flux planifié quotidien sur la colonne Date de dépublication.
T13	**Blocage de la soumission si métadonnées obligatoires absentes**	Power Automate	Contrôle dans le flux de soumission : refus et notification au contributeur. > À tester dès la phase 1 : sur les pages, les colonnes obligatoires ne bloquent pas la publication de façon fiable.
T14	**Notifications Teams (6 événements, §7.1.4.3)**	Power Automate	Connecteur Teams, message dans un canal ou une conversation.
T15	**Vue « contenus proches d'échéance » (§7.1.7)**	Standard	Affichage filtré de la bibliothèque Pages ([Aujourd'hui]+30) + mise en forme JSON.

Consultation et recherche

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
T16	**Versioning, partage de lien, impression, visionneuse Office**	Standard	Natif.
T17	**Formulaire de contact (§7.1.5)**	Standard Power Automate	Microsoft Forms ou liste + flux de routage vers le propriétaire. > Règle de routage à définir par la gouvernance.
T18	**Auto-complétion**	Configuration	Suggestions de requête de PnP Search Box.
T19	**Thésaurus orthographique et synonymique**	Développement	SharePoint Online n'offre pas de thésaurus administrable : extension PnP (modificateur de requête) lisant une liste de synonymes. > Point à arbitrer §17 : candidat au lot 2.
T20	**Historique des recherches récentes**	Développement	Non natif : stockage navigateur dans un composant SPFx. > Candidat au lot 2.

Pilotage

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
T21	**Consultations, utilisateurs uniques (§7.1.8)**	Standard	Analyse d'utilisation du site + portail statistiques WP Covéa (prévu par la spécification).
T22	**Recherches sans résultat, sans clic, nuage de mots**	Développement	Journalisation par extension PnP vers une liste ou Application Insights. > Non exposé finement par SharePoint Online. RGPD : agrégation et seuils.
T23	**Détection des liens cassés (§7.1.3)**	Script	Script PnP.PowerShell planifié qui produit un rapport dans une liste.

Éditique et migration

RÉF.	COMPOSANT	SOLUTION	MISE EN ŒUVRE
T24	**Site imprimeGMF : bibliothèques DMCP et Documents (§12.2.2)**	Standard	Natif, avec métadonnées spécifiques.
T25	**Flux de transfert quotidien des imprimés (§12.2.3)**	Power Automate	Lecture de PDF_A_TRANSFERER, découpage du nom, copie, renommage, déplacement, notification Teams.
T26	**Migration HTML Lotus Notes → pages natives (§8.2)**	Script	PnP.PowerShell : nettoyage HTML, création des pages, réécriture des liens Reference=..., métadonnées depuis Excel.
T27	**Archive HTML statique d'Odyssée (§15)**	Script	Export statique sur répertoire partagé.

RECOMMANDATIONS

6. Recommandations d'architecture

R1 · Lancer la validation des packages SPFx en semaine 1

PnP Modern Search et les packages maison passent par le catalogue d'applications. C'est le délai le moins maîtrisable du projet : envoyer la demande avant même d'écrire le code.

R2 · Une page par famille plutôt qu'une page dynamique unique

La spécification prévoit une page dynamique unique (§10.1.1). Créer une page par famille (13 pages issues d'un modèle) rend le titre, le préfiltre de recherche et les nouveautés réalisables en standard ou en configuration, avec des URL lisibles et partageables. Seuls les menus restent développés. Coût : 13 pages à créer une fois.

R3 · Un seul package « Navigation documentaire »

Menu latéral, sous-menu, menu de niveau 7 et fil d'ariane lisent la même liste. Les regrouper dans une solution qui charge l'arborescence une fois et la met en cache évite quatre appels par page et garantit un comportement identique (statut brouillon, droits, ordre).

R4 · Étudier la banque de termes pour l'arborescence

Une colonne de métadonnées gérées offre en natif le sélecteur hiérarchique (remplace T4), un filtre de recherche hiérarchique et une navigation pilotée par les termes. Elle ne gère toutefois ni le statut brouillon ni l'habilitation par nœud prévus au §9.2. Piste : garder la liste comme référentiel maître et synchroniser un jeu de termes, ou réserver la taxonomie au lot 2. À trancher avec la DSIN avant la phase 1.

R5 · Accepter les écarts cosmétiques

Prénom sur l'accueil (B2), bloc collant (E9), dates en pastilles (E7) : ces écarts coûtent du développement sans valeur métier. Les faire valider tôt par le pilote métier.

R6 · Tout provisionner par script

Colonnes, type de contenu, listes, pages modèles et composants configurés : un modèle PnP (Invoke-PnPSiteTemplate) permet de reconstruire le site à l'identique en recette, en pilote et en production.

CHIFFRAGE

7. Charge de réalisation

Estimations indicatives pour un développeur SharePoint confirmé, hors recette et hors migration. À affiner après la phase 1.

Développements SPFx

PACKAGE	COUVRE	CONTENU	CHARGE	LOT
SPFx « Navigation documentaire »	D0, D1, D2, E1, E2, E5, T9	Arbre latéral, sous-menu, menu niveau 7, fil d'ariane, filtrage brouillon. Une seule lecture de la liste Arborescence, mise en cache.	**10 à 15 j**	MVP
SPFx « Favoris »	C3, D6, E4, G5	Liste Favoris, bouton d'ajout, affichages accueil et famille, étoile dans les résultats.	**4 à 6 j**	MVP
SPFx « Rattachement contributeur »	T4, T5	Listes en cascade dans la page, écriture de l'Id et du chemin, multi-rattachement.	**4 à 6 j**	MVP*
SPFx « Outils de page »	E3, E8	Badge Nouveauté, sommaire « Dans cette page ».	**2 à 3 j**	MVP
Extensions recherche PnP	T19, T20, T22	Synonymes, historique des recherches, journalisation des requêtes.	**5 à 8 j**	Lot 2

* Si la recommandation R4 (taxonomie) est retenue, ce package disparaît.

Flux Power Automate

FLUX	COUVRE	CHARGE
Calcul des chemins d'arborescence	T3	**1 à 2 j**
Report des droits	T8	**2 à 3 j**
Workflow de validation + contrôle métadonnées + notifications Teams	T10, T13, T14	**5 à 7 j**
Dépublication automatique + alerte d'échéance	T12	**1 à 2 j**
Routage du formulaire de contact	T17	**1 j**
Transfert éditique DMCP	T25	**3 à 4 j**

Configuration et scripts

Pages standard, thème, navigation	A1–A3, B, C, E6–E7	**3 à 4 j**
Recherche PnP : 3 pages, modèles, filtres	C1, D4–D5, F, G	**8 à 12 j**
Script de provisioning + propriétés gérées	T1, T2, T6	**3 à 4 j**
Script de détection des liens cassés	T23	**2 à 3 j**

20 – 30 j
SPFx, périmètre MVP

13 – 19 j
Power Automate


16 – 23 j
Configuration et scripts

5 – 8 j
Lot 2 éventuel

PLANNING

8. Feuille de route

Huit phases, dont certaines en parallèle. Les semaines sont relatives au démarrage et à recaler sur le jalon de MEP réel.

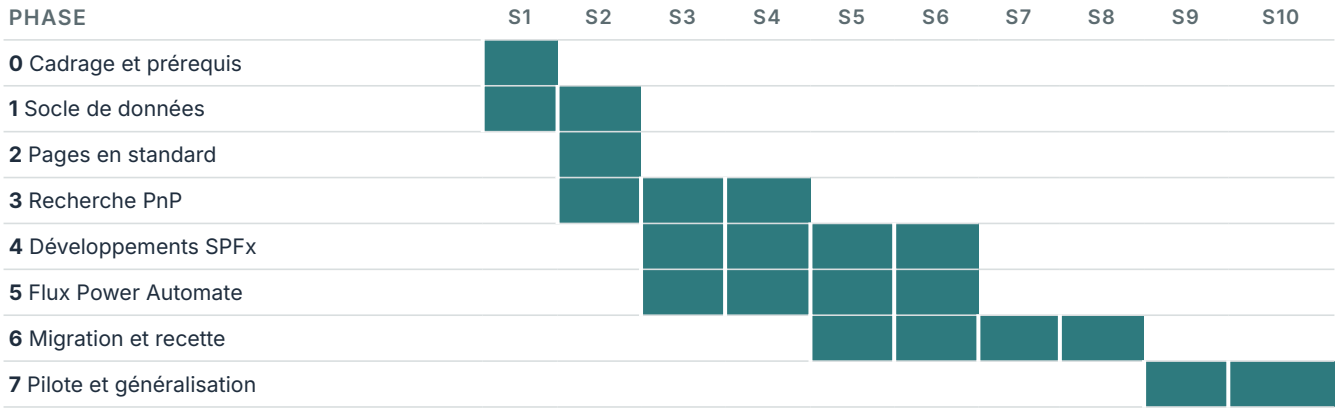

0 Cadrage et prérequis — S1

- Accès au site cible, à la recette et aux maquettes UX
- Vérifier que PnP Modern Search est déployé dans le catalogue d'applications Covéa et lancer la demande de validation des packages SPFx
- Thème d'organisation, droits d'administration du schéma de recherche
- Faire trancher les arbitrages bloquants (section 10)

1 Socle de données — S1 – S2

- Colonnes de site + type de contenu (script de provisioning)
- Liste Arborescence alimentée avec l'exemple §9.2
- Bibliothèques par propriétaire + groupes de test GAZH
- 20 pages d'exemple réparties sur 2 familles
- Mapping des propriétés gérées, réindexation

2 Pages en standard — S2

- En-tête, thème, navigation hub et site
- Homepage du hub et homepage documentation (Liens rapides, ciblage d'audience)
- Modèles de page famille et produit

3 Recherche PnP — S2 – S4

- Page de résultats complète (G1 à G4)
- Home page recherche avec tuiles (F1 à F3)
- Modules préfiltrés famille : recherche et nouveautés (D4, D5)

4 Développements SPFx — S3 – S6

- Package Navigation documentaire
- Package Favoris
- Package Rattachement contributeur
- Outils de page

5 Flux Power Automate — S3 – S6

- Workflow de validation et notifications
- Dépublication, droits, chemins
- Transfert éditique DMCP

6 Migration et recette — S5 – S8

- Migration n° 1 pour les TAU et la formation des contributeurs
- Recette fonctionnelle par profil (lecteur, contributeur, valideur, admin)
- Migration finale

7 Pilote et généralisation — S9 +

- Pilote avec Lotus Notes maintenu en parallèle (§14)
- Corrections, statistiques, préparation du décommissionnement

DÉMARRAGE

9. Première semaine

Objectif : sortir de la semaine avec un environnement, un socle de données et des décisions en cours.

JOUR	ACTIONS	LIVRABLE
Jour 1	Lire les §7, 9, 10 et 11 de la spécification. Obtenir les accès : site cible, maquettes UX, les deux classeurs « Arborescence, métadonnée et propriétaire ».	Accès obtenus
Jour 2	Faire l'inventaire de l'existant avec Eric Saverot (pilote SI) : site créé ? colonnes ? script de migration CooperTeam ? PnP Modern Search installé ?	État des lieux écrit
Jour 3	Monter un site de développement. Installer l'outillage : Node LTS, SPFx, PnP.PowerShell. Créer le dépôt Git.	Environnement prêt
Jour 4	Créer colonnes, type de contenu et liste Arborescence par script. Saisir l'exemple §9.2.	Script de provisioning v1
Jour 5	Créer 20 pages d'exemple, mapper les propriétés gérées, lancer la réindexation. Envoyer la liste des arbitrages aux décideurs.	Recherche testable en S2

Ordre de travail recommandé ensuite

- Commencer par la **page de résultats** : elle valide les propriétés gérées et sert toutes les autres pages.
- Monter ensuite les **pages standard**, rapides et visibles pour les démonstrations.
- Lancer le **package Navigation documentaire** dès la validation SPFx obtenue : c'est le plus gros chantier.
- Mener les **flux Power Automate** en parallèle : ils dépendent du type de contenu, pas des pages.

DÉCISIONS

10. Arbitrages à obtenir

Questions ouvertes de la spécification et de cette étude, avec le décideur selon le RACI (§6.1).

#	QUESTION	IMPACT	DÉCIDEUR
1	**Page famille : une page dynamique unique (spécification) ou une page par famille ?**	Une page par famille supprime D3 en dev et simplifie les URL.	**DSIN (R) · Pilote métier (A)**
2	**Familles du menu du site : statiques ou lues dans l'arborescence ?**	Statique = standard ; dynamique = Application Customizer.	**Pilote métier**
3	**Arborescence : liste (spécification) ou banque de termes ?**	Voir recommandation R4.	**DSIN**
4	**Ancres et sommaire : la maquette les montre, le §8.2.2 les exclut**	Conditionne E6 et E8.	**DSIN + Pilote métier**
5	**Multi-rattachement : quel chemin dans le fil d'ariane ?**	Conditionne D2 et T5.	**Gouvernance documentaire**
6	**Nombre de jours par défaut des nouveautés (TODO §10.2.3.5)**	Paramètre de D5.	**Gouvernance documentaire**
7	**Thésaurus, historique, statistiques fines : MVP ou lot 2 ?**	5 à 8 j de développement en jeu.	**Sponsor · Pilote entreprise**
8	**Groupes contributeurs et valideurs vides : DDEV, DMCP, DAV (§7.1.1.2)**	Bloque la recette des droits et du workflow.	**Pilotes métier**
9	**Écarts visuels acceptés : prénom d'accueil, bloc non collant**	Évite du développement cosmétique.	**Pilote métier**

ANNEXE

Propriétés gérées de recherche

Proposition de mapping des métadonnées (§7.1.2.3) vers les propriétés affinables de SharePoint Online. Les noms de propriétés analysées (ows_...) apparaissent après la première indexation des pages d'exemple.

MÉTADONNÉE	TYPE DE COLONNE	PROPRIÉTÉ GÉRÉE	USAGE
Corpus documentaire	Choix	`RefinableString00`	Filtre univers
Famille (niveau 2)	Texte / lookup	`RefinableString01`	Domaine de recherche, préfiltre famille
Catégorie (niveau 3)	Texte / lookup	`RefinableString02`	Catégorie de recherche
Produit (niveau 6)	Texte / lookup	`RefinableString03`	Filtre Produit
Type documentaire	Choix	`RefinableString04`	Filtre type
Propriétaire	Choix	`RefinableString05`	Routage, statistiques
Statut	Choix	`RefinableString06`	Exclure les non publiés
ArborescenceLibellé	Texte multiligne	`RefinableString07`	Chemin dans les résultats
ArborescenceId	Texte	`RefinableString08`	Lien avec le menu
Date d'application	Date	`RefinableDate00`	Recherche par date d'application
Date de fin d'application	Date	`RefinableDate01`	Recherche par date d'application
Date de nouveauté	Date	`RefinableDate02`	Nouveautés, filtre date
Date de publication	Date	`RefinableDate03`	Tri, filtre « Date de publication »

Procédure

- Créer les colonnes et au moins une page renseignée par valeur.
- Paramètres du site › Schéma de recherche : mapper chaque propriété analysée vers la propriété gérée, avec un alias lisible (ex. GmfFamille).
- Paramètres de la bibliothèque › Avancé › Réindexer la bibliothèque.
- Vérifier dans PnP Search Results (mode debug) que les valeurs remontent, puis configurer les filtres.
